
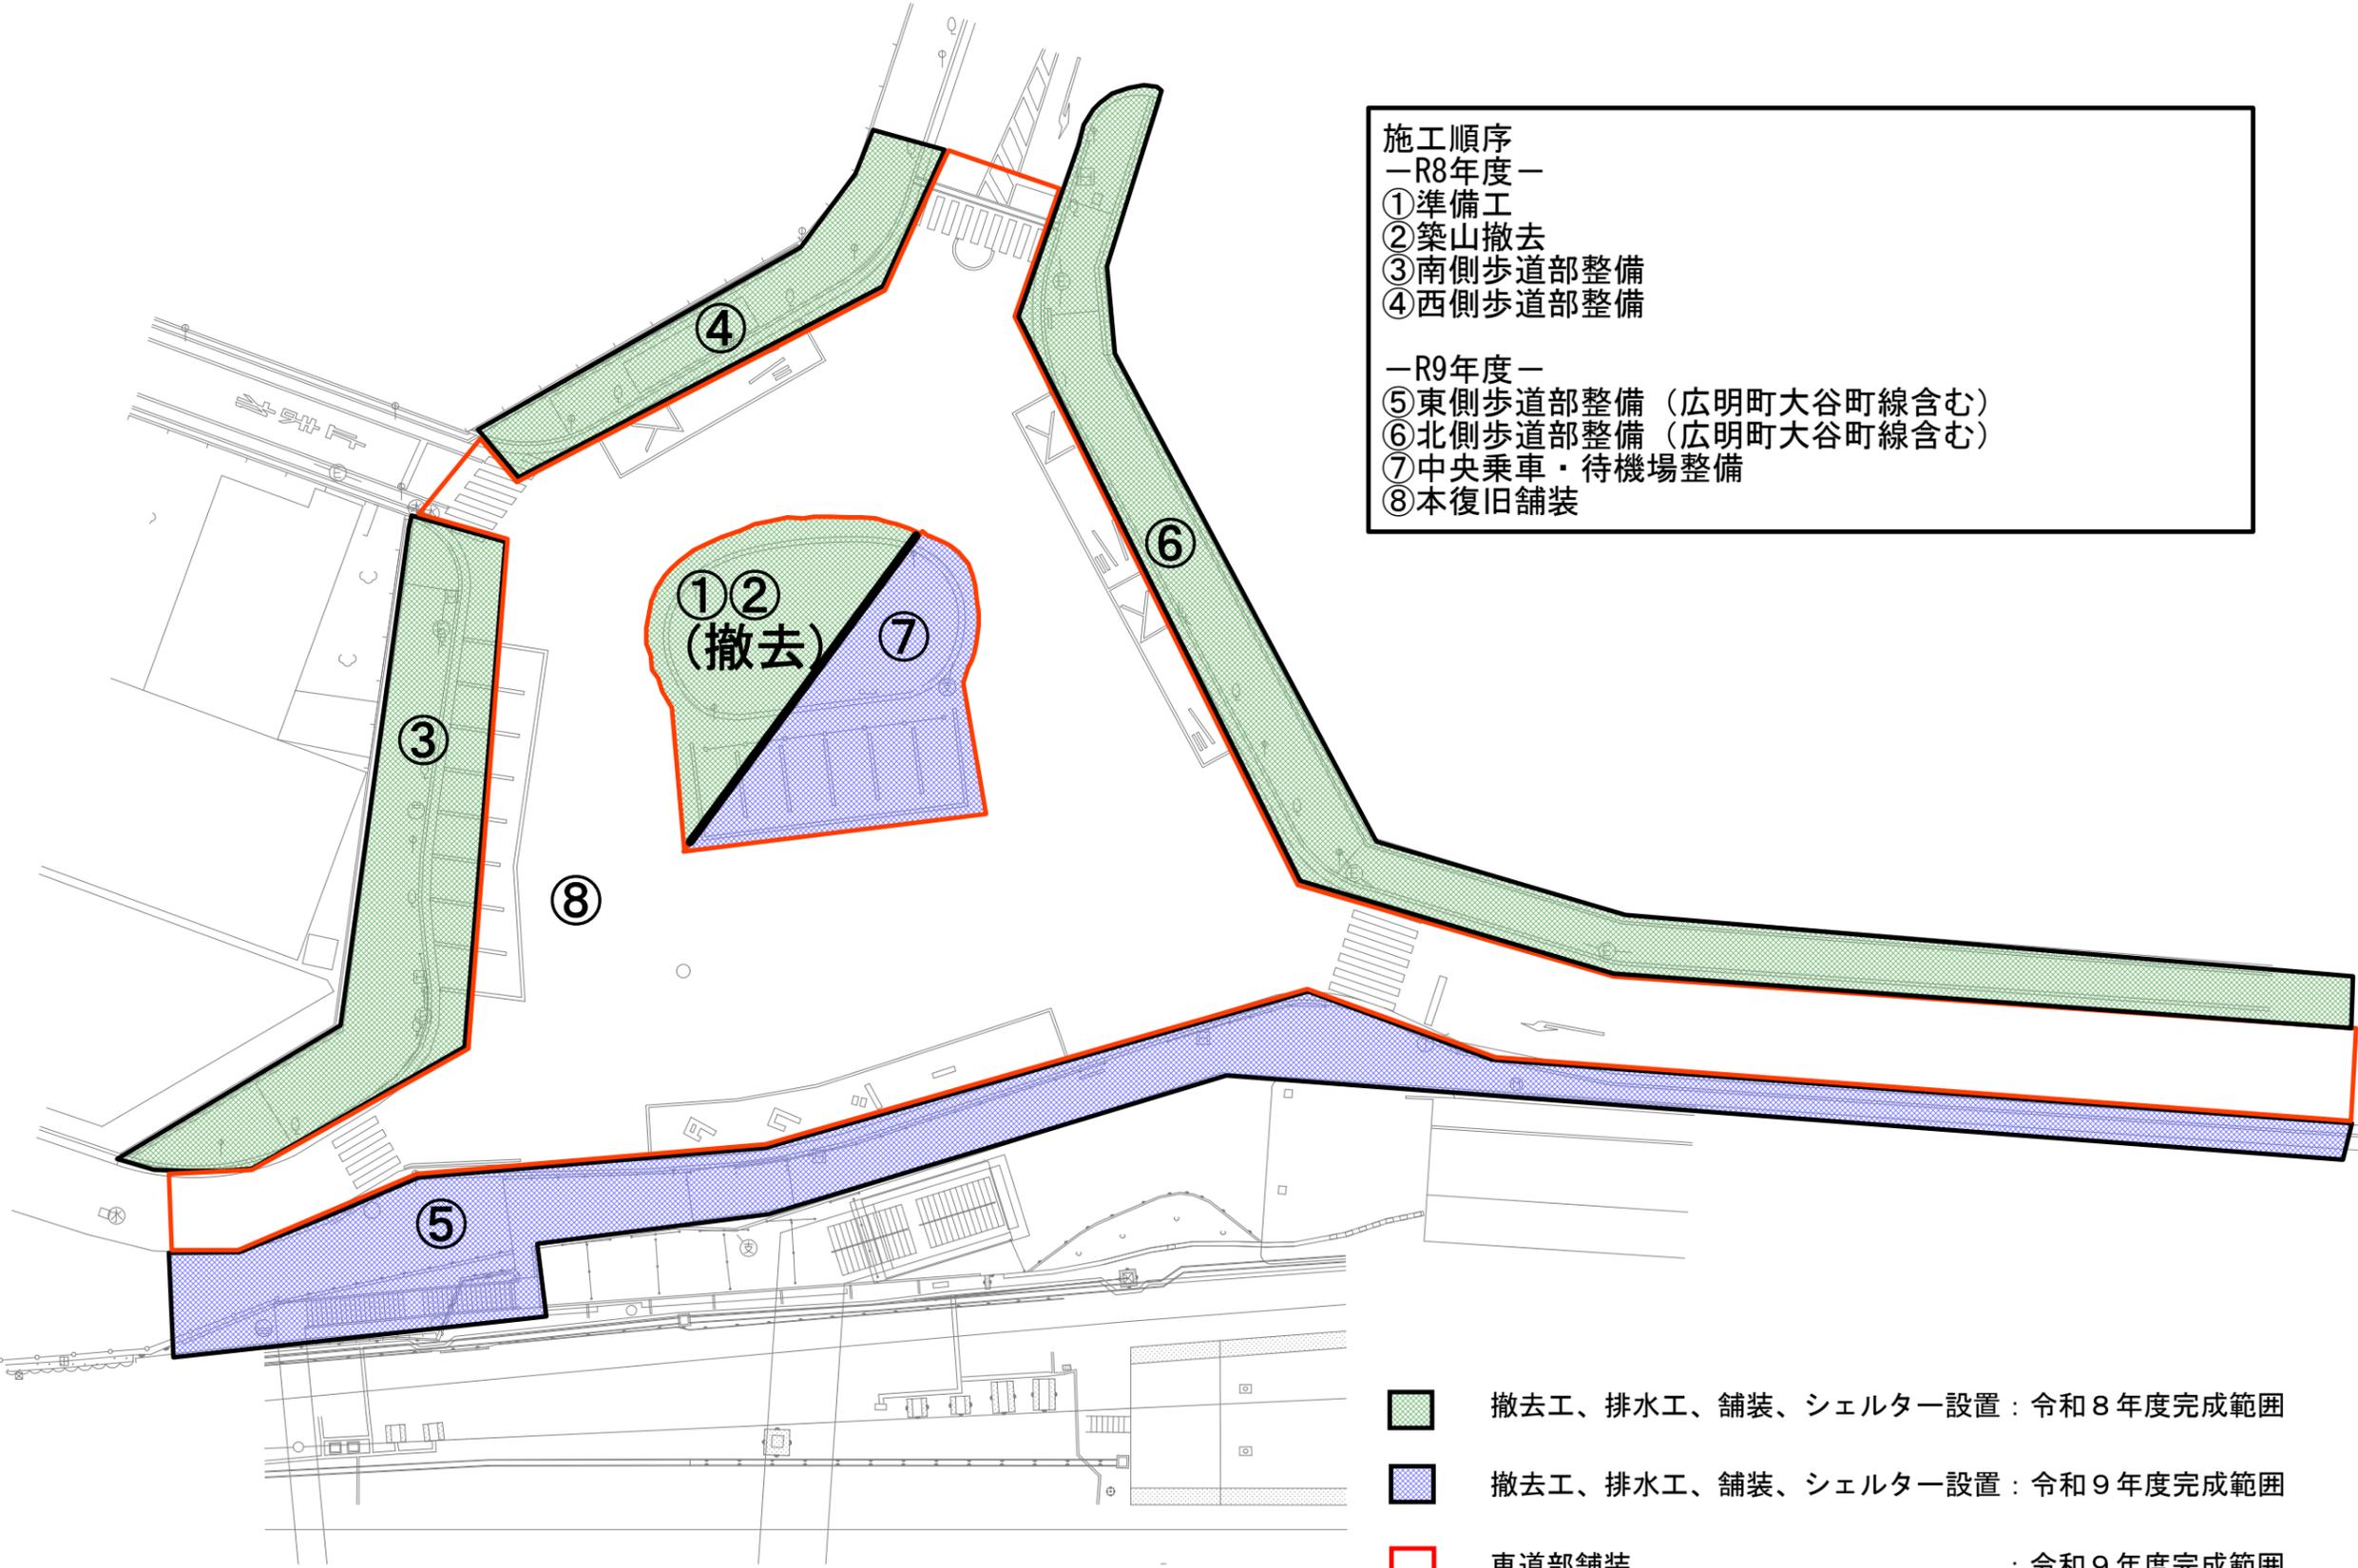


施工順序図




全体施工工程表(津駅西口駅前広場再整備工事)

		R 8 (計画)												R 9 (計画)											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	津駅西口再整備					・①準備工 ・②築山撤去 ③南側歩道整備 ④西側歩道整備							・①準備工 ・⑤東側歩道整備 ⑥北側歩道整備 ⑦中央乗車・待機場整備						・⑧本復旧舗装 (夜間施工)						
関係機関工事	パーキングチケット撤去 (県警施工)	・パーキングチケット停止 (3/31)			パーキングチケット機撤去工事 実工程期間(約1週間)																				
	電柱支障移設工事 (中部電力、NTT、ZTV)	電柱移設工事(1本) 実工程期間(約1週間)						電柱移設工事(4本) 実工程期間(約1か月)																	
	雨水工事 (下水道工務課)	雨水函渠布設工事(夜間施工) 実工程期間(約4~5か月)																							
	水道工事 (水道整備課)	給水管移設工事(夜間施工) 実工程期間(約1週間)				水道管老朽化対策工事(夜間施工) 実工程期間(約2か月)																			

関係機関施工箇所

- 既設雨水函渠
- 新設雨水函渠布設工事
- 水道管老朽化対策工事
- 給水管移設工事
- 電柱移設工事

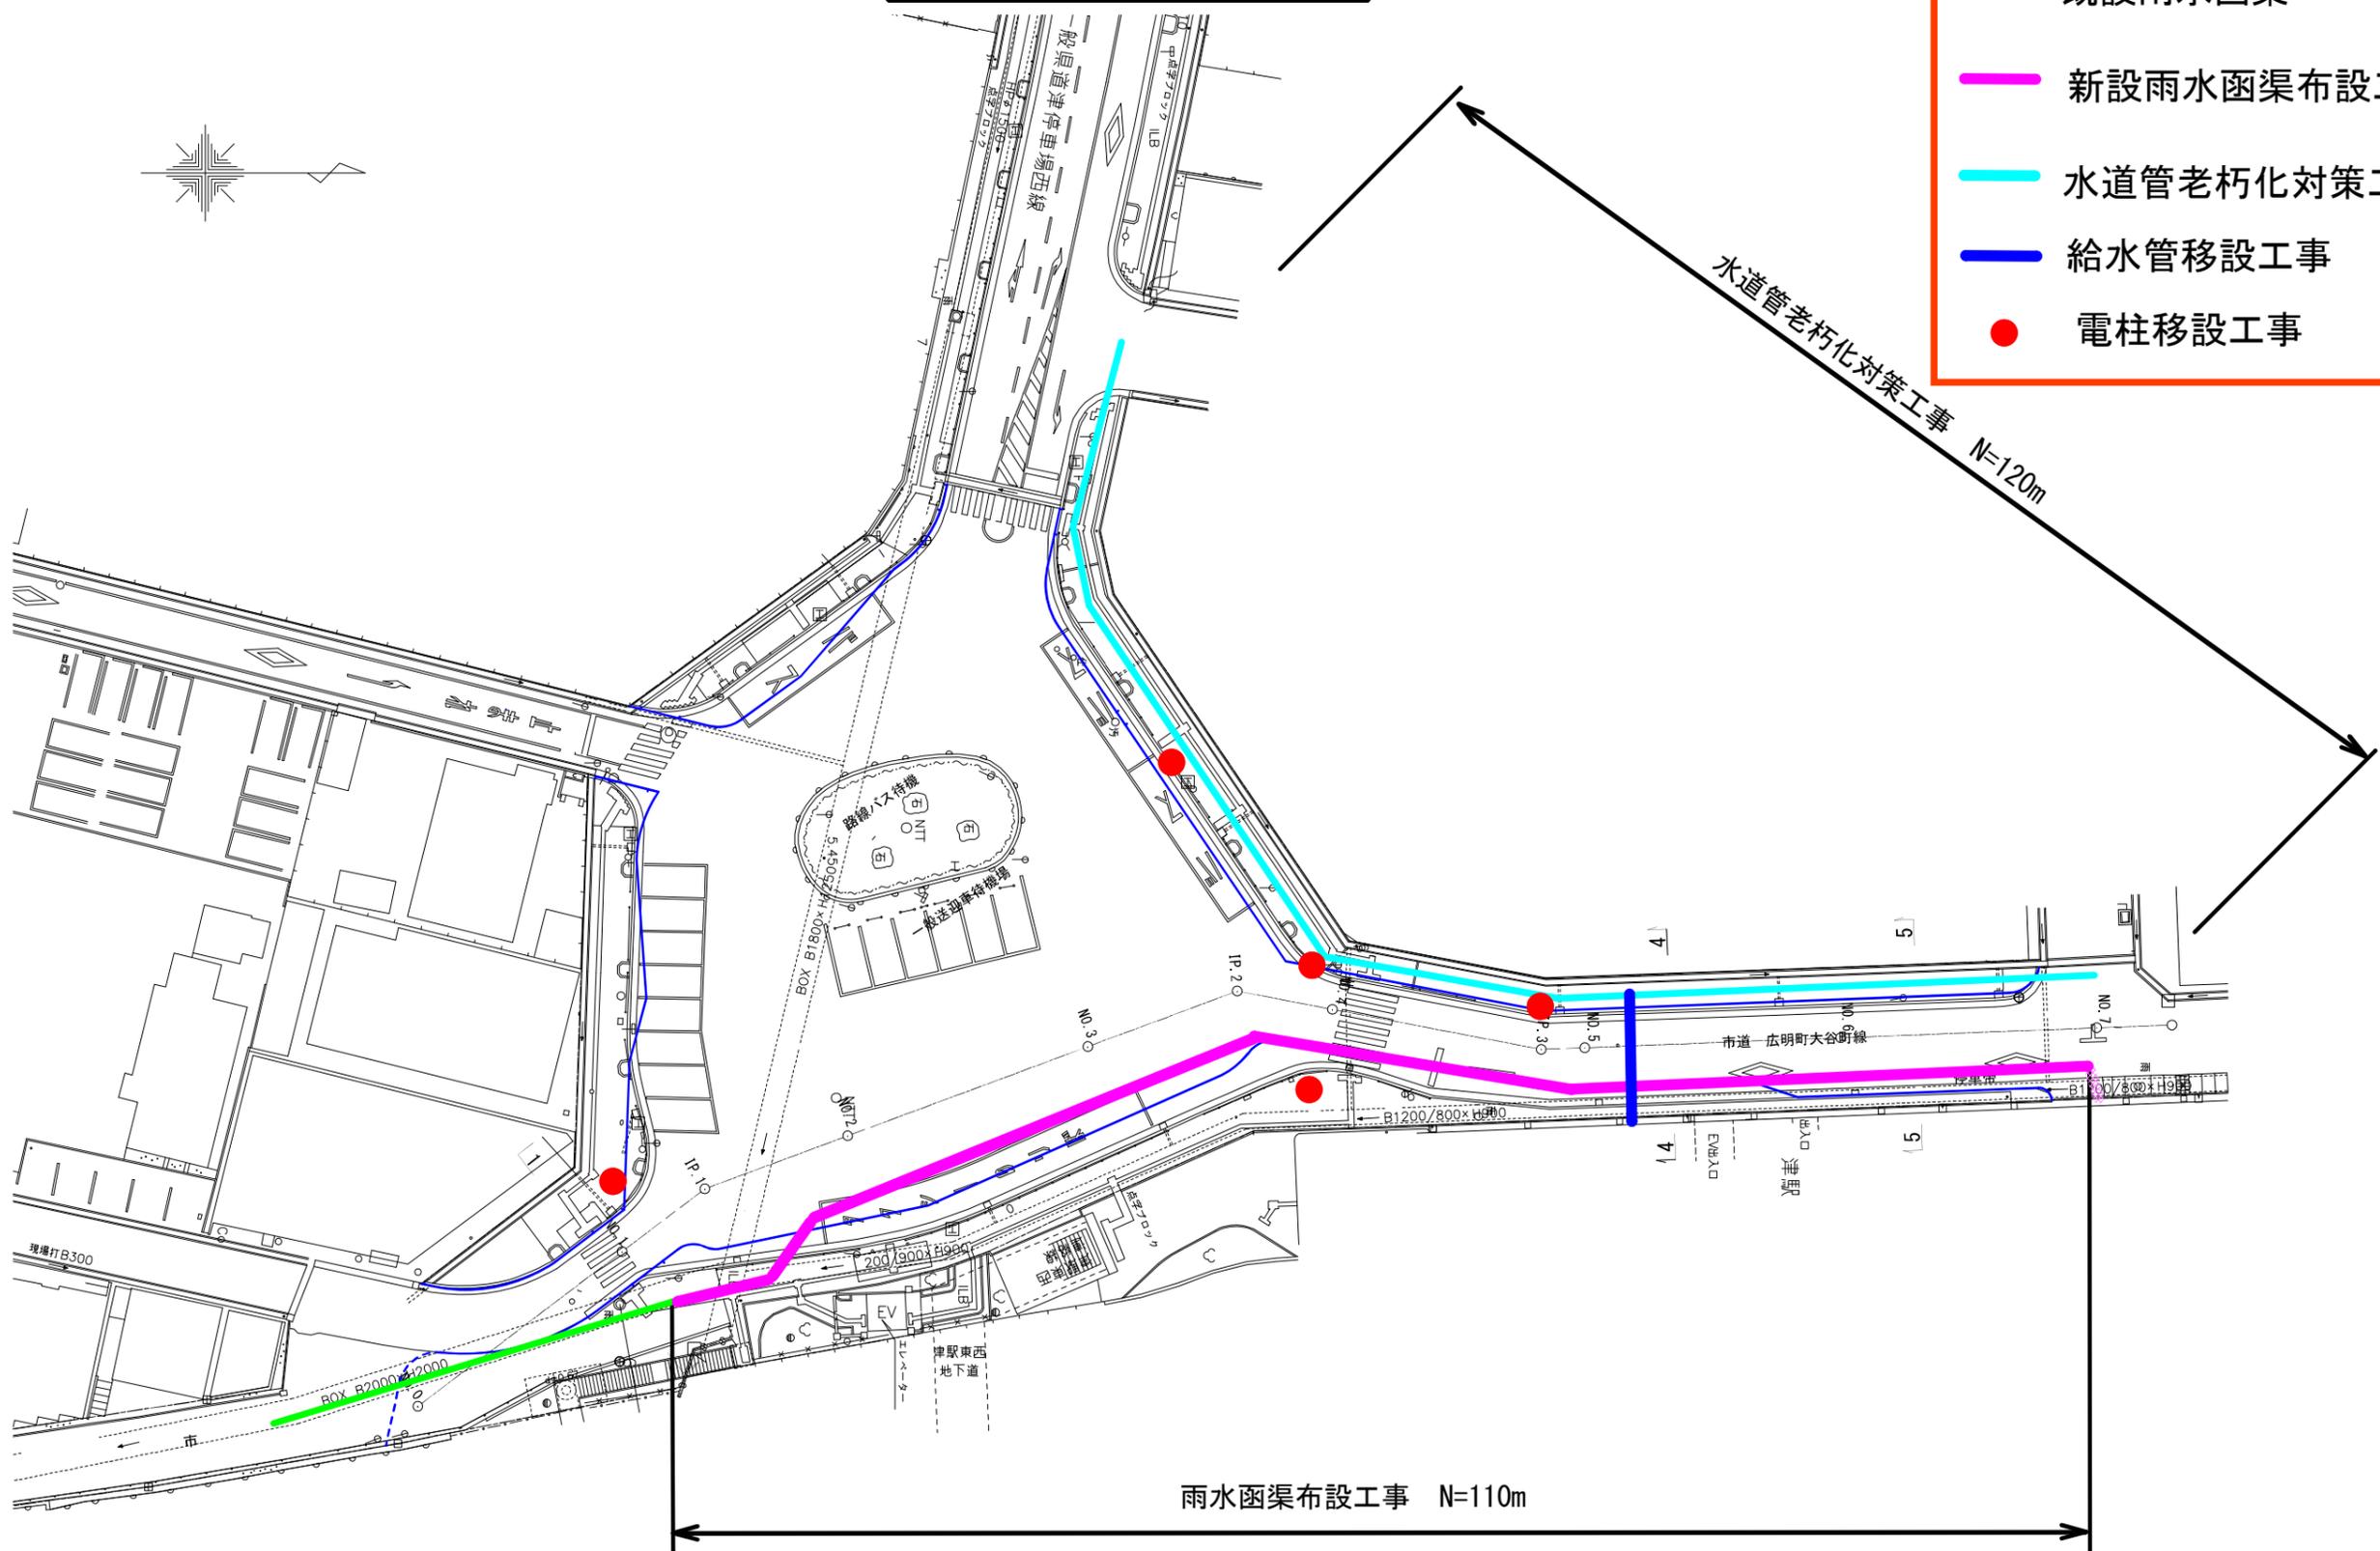

水道管老朽化対策工事 N=120m

雨水函渠布設工事 N=110m
