

2. 対象事業に係る工事の進捗状況

2. 対象事業に係る工事の進捗状況

評価書で示した土地利用計画の概要を図 2-1 に示す。また、評価書に記載された工事工程計画は表 2-1 に示すとおりであり、2013 年度から工事に着手し、2015 年度に第 1 期工事が完了、2016 年度より一部供用を開始している。


工事計画段階当初、埋め立ては 2016 年度から 2030 年度まで 15 年間行う予定であったが、現在、第 1 期工事で施工した 1 槽のみで今後の相当期間の埋め立てを行う予定である。第 2 期工事予定地については、法面保護のため盛土を行っているが、本格的な埋め立て地の造成時期は未定であり、工事着工まで相当期間空く予定である。

なお、環境学習施設の建築並びに公園緑地の整備については未定である。

表 2-1 工事工程

工種	2013年度 (平成25年度)	2014年度 (平成26年度)	2015年度 (平成27年度)	2016年度 (平成28年度)	2017年度 (平成29年度)	2018年度 (平成30年度)	2019年度 (平成31年度)	2020年度 (令和2年度)	2021年度 (令和3年度)	2022年度 (令和4年度)	2023年度 (令和5年度)	2024年度 (令和6年度)	2025年度 (令和7年度)
進入路 新設工事	■	■											
建設地 内造成 工事	■	■	■										
最終処 分場建 設工事		■	(第1期) ■				(場内保全工事) ■						
環境学 習施設 建築工 事							最終処分場第2期工事は 工事開始時期 検討中						
公園緑 地整備													
供用開 始				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■	予定
■	一部予定
■	実績

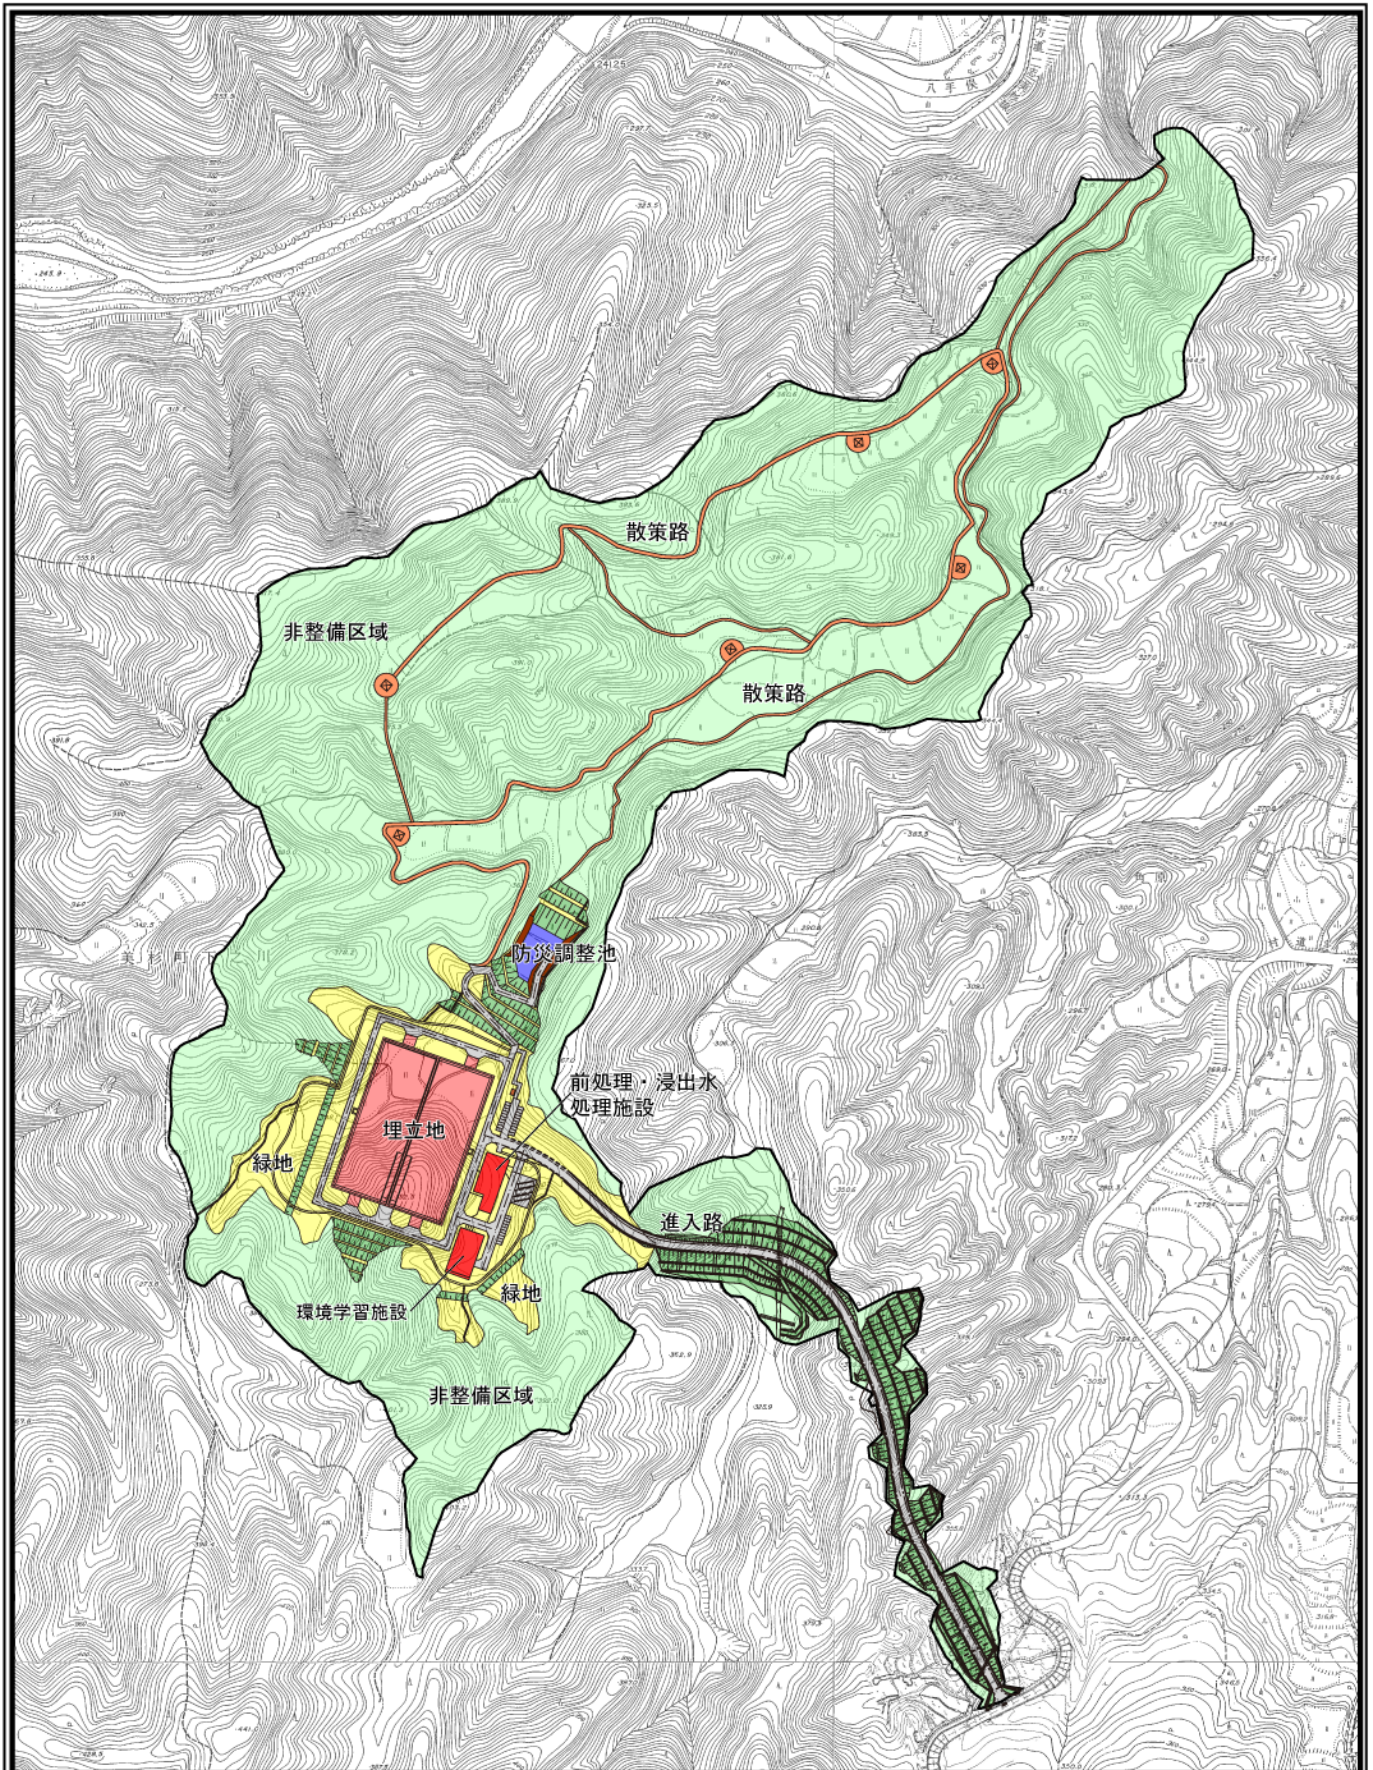

凡 例

——— : 対象事業実施区域

図 2-1 土地利用計画の概要

