

大谷踏切道拡幅事業(近鉄名古屋線津・江戸橋間における上津架道橋改築工事)

[illegible]

大谷踏切道拡幅事業(近鉄名古屋線津・江戸橋間における上津架道橋改築工事)

現場作業進捗状況

平成27年9月

(東→西)



現場着手前

平成27年度 事業化を決定
平成28年度 踏切道改良促進法「改良すべき踏切道」の法指定を受ける
平成29年度 防災・安全交付金を活用し事業着手

(西→東)



令和2年12月



既設踏切撤去状況

平成30年度 JR東海及び伊勢鉄道と工事協定を締結
令和元年度 分岐器を移設
令和2年度 既設踏切の撤去が完了しました。

令和3年11月



補償物件解体状況

踏切拡幅に必要な用地補償を進めました。

令和4年3月



近鉄架道橋工事に着手

令和3年12月 近鉄と工事協定を締結
準備工(電柱の移設工事)に着手

令和4年8月末



新踏切道の工事状況

踏切道移転拡幅工事を進めております。
8月末に踏切保安施設(信号機・遮断機・警報機)の設置完了

大谷踏切道拡幅事業(近鉄名古屋線津・江戸橋間における上津架道橋改築工事)

現場作業進捗状況



近鉄架道橋 本体工事に着手

令和4年9月 JR踏切道を工事用道路として利用開始
作業用構台設置工に着手



作業用構台設置状況


西側の作業用構台の設置作業を進めています。



作業用構台設置状況



作業用構台設置状況

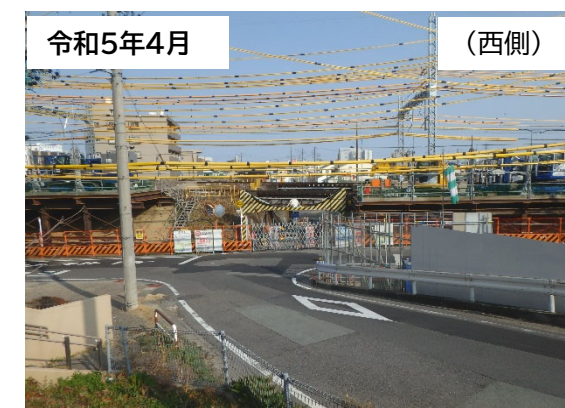

作業用構台設置状況

1月に東西両側の作業用構台の設置作業が完了しました。
2月から線路の仮橋設置工に着手 ※仮橋の橋台・橋脚設置(鋼管杭打設)

大谷踏切道拡幅事業(近鉄名古屋線津・江戸橋間における上津架道橋改築工事)

現場作業進捗状況



近鉄架道橋 仮桁設置作業



仮桁設置状況

令和5年7月 夜間作業にて仮桁設置作業が完了しました。



仮桁設置状況



掘削等作業状況



下部工作業状況

8月から土留工・掘削・旧橋台撤去作業に着手しました。
9月から下部工に着手 ※基礎杭作業

大谷踏切道拡幅事業(近鉄名古屋線津・江戸橋間における上津架道橋改築工事)

現場作業進捗状況



近鉄架道橋 新橋台設置作業

令和6年4月 新橋台設置作業が完了しました。
