

2. 対象事業に係る工事の進捗状況

2. 対象事業に係る工事の進捗状況

評価書で示した土地利用計画の概要を図 2-1 に示す。また、評価書に記載された工事工程計画は表 2-1 に示すとおりであり、2013 年度から工事に着手し、2015 年度に第 1 期工事が完了、2016 年度より一部供用を開始している。


埋め立ては 2016 年度から 2030 年度まで 15 年間行う予定であり、残りの 1 槽については、第 1 期の埋め立て状況を見ながら、施工を行う予定である。また、第 2 期工事予定地については、法面保護のため盛土を行っている。

なお、環境学習施設の建築並びに公園緑地の整備については未定である。

表2-1 工事工程

工 種	2013 年度 (平成 25 年度)	2014 年度 (平成 26 年度)	2015 年度 (平成 27 年度)	2016 年度 (平成 28 年度)	2017 年度 (平成 29 年度)	2018 年度 (平成 30 年度)	2019 年度 (平成 31 年度)	2020 年度 (令和 2 年度)	2021 年度 (令和 3 年度)	2022 年度 (令和 4 年度)
進 入 路 新 設 工 事										
建 設 地 内 造 成 工 事										
最 終 処 分 場 建 設 工 事			(第 1 期)				(場内保全工事)			
環 境 学 習 施 設 建 築 工 事							最終処分場第 2 期工事は 工事開始時期 検討中			
公 園 緑 地 整 備							環境学習施設、公園緑地 整備は、未定			
供用開始										

	予 定
	一 部 予 定
	実 績

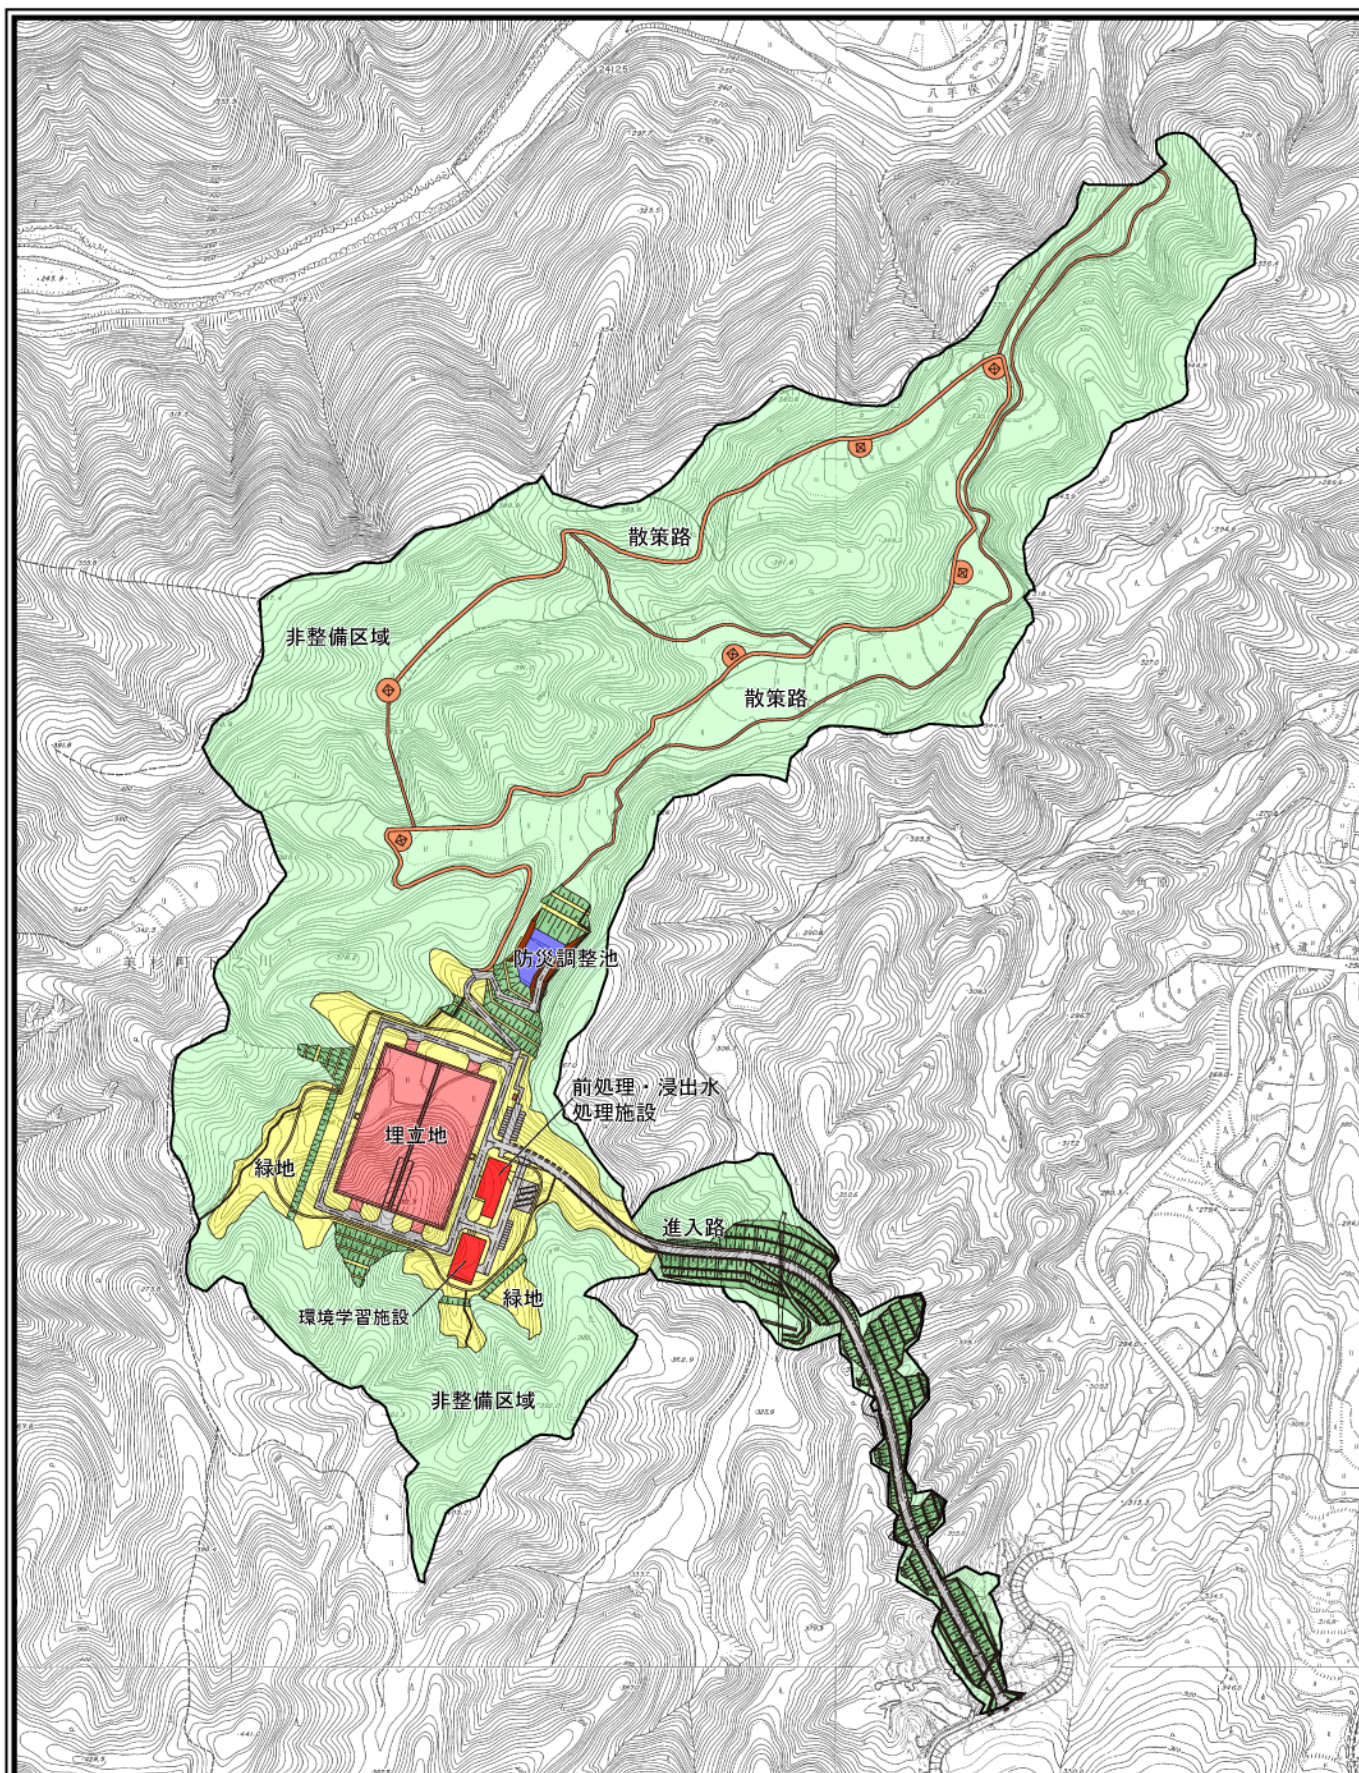

凡 例

——— : 対象事業実施区域

図 2-1 土地利用計画の概要

