

## **2. 対象事業に係る工事の進捗状況**

## 2. 対象事業に係る工事の進捗状況

評価書で示した土地利用計画の概要を図 2-1 に示す。また、評価書に記載された工事工程計画は表 2-1 に示すとおりであり、2013 年度から工事に着手し、2015 年度に第 1 期工事が完了、2016 年度より一部供用を開始している。


埋め立ては 2016 年度から 2030 年度まで 15 年間行う予定であり、残りの 1 槽については、第 1 期の埋め立て状況を見ながら、施工を行う予定である。また、第 2 期工事予定地については、工事中断中の安全性の問題から、今年度に埋め戻し作業を行っており、これに伴ってコンクリートの搬入、打設が行われている。

なお、2020 年度には処分場内の保全等工事を行う予定であり、環境学習施設の建築並びに公園緑地の整備については、2020 年度以降に工事を開始する予定である。

表2-1 工事工程

工 種	2013年度 (平成25 年度)	2014年度 (平成26 年度)	2015年度 (平成27 年度)	2016年度 (平成28 年度)	2017年度 (平成29 年度)	2018年度 (平成30 年度)	2019年度 (平成31 年度)	2020年度	
進入路新設工事	■								
建設地内造成工事	■		■						
最終処分場建設工事		(第1期) ■					■ 場内保全等 工事予定		
環境学習施設建築工事							最終処分場第2期工事は 工事開始時期 検討中		
公園緑地整備							環境学習施設、公園緑地 整備は、2020年度以降 工事開始予定		
供用開始				■					■

■ 予定  
 ■■■ 一部予定  
 ■■■■ 実績

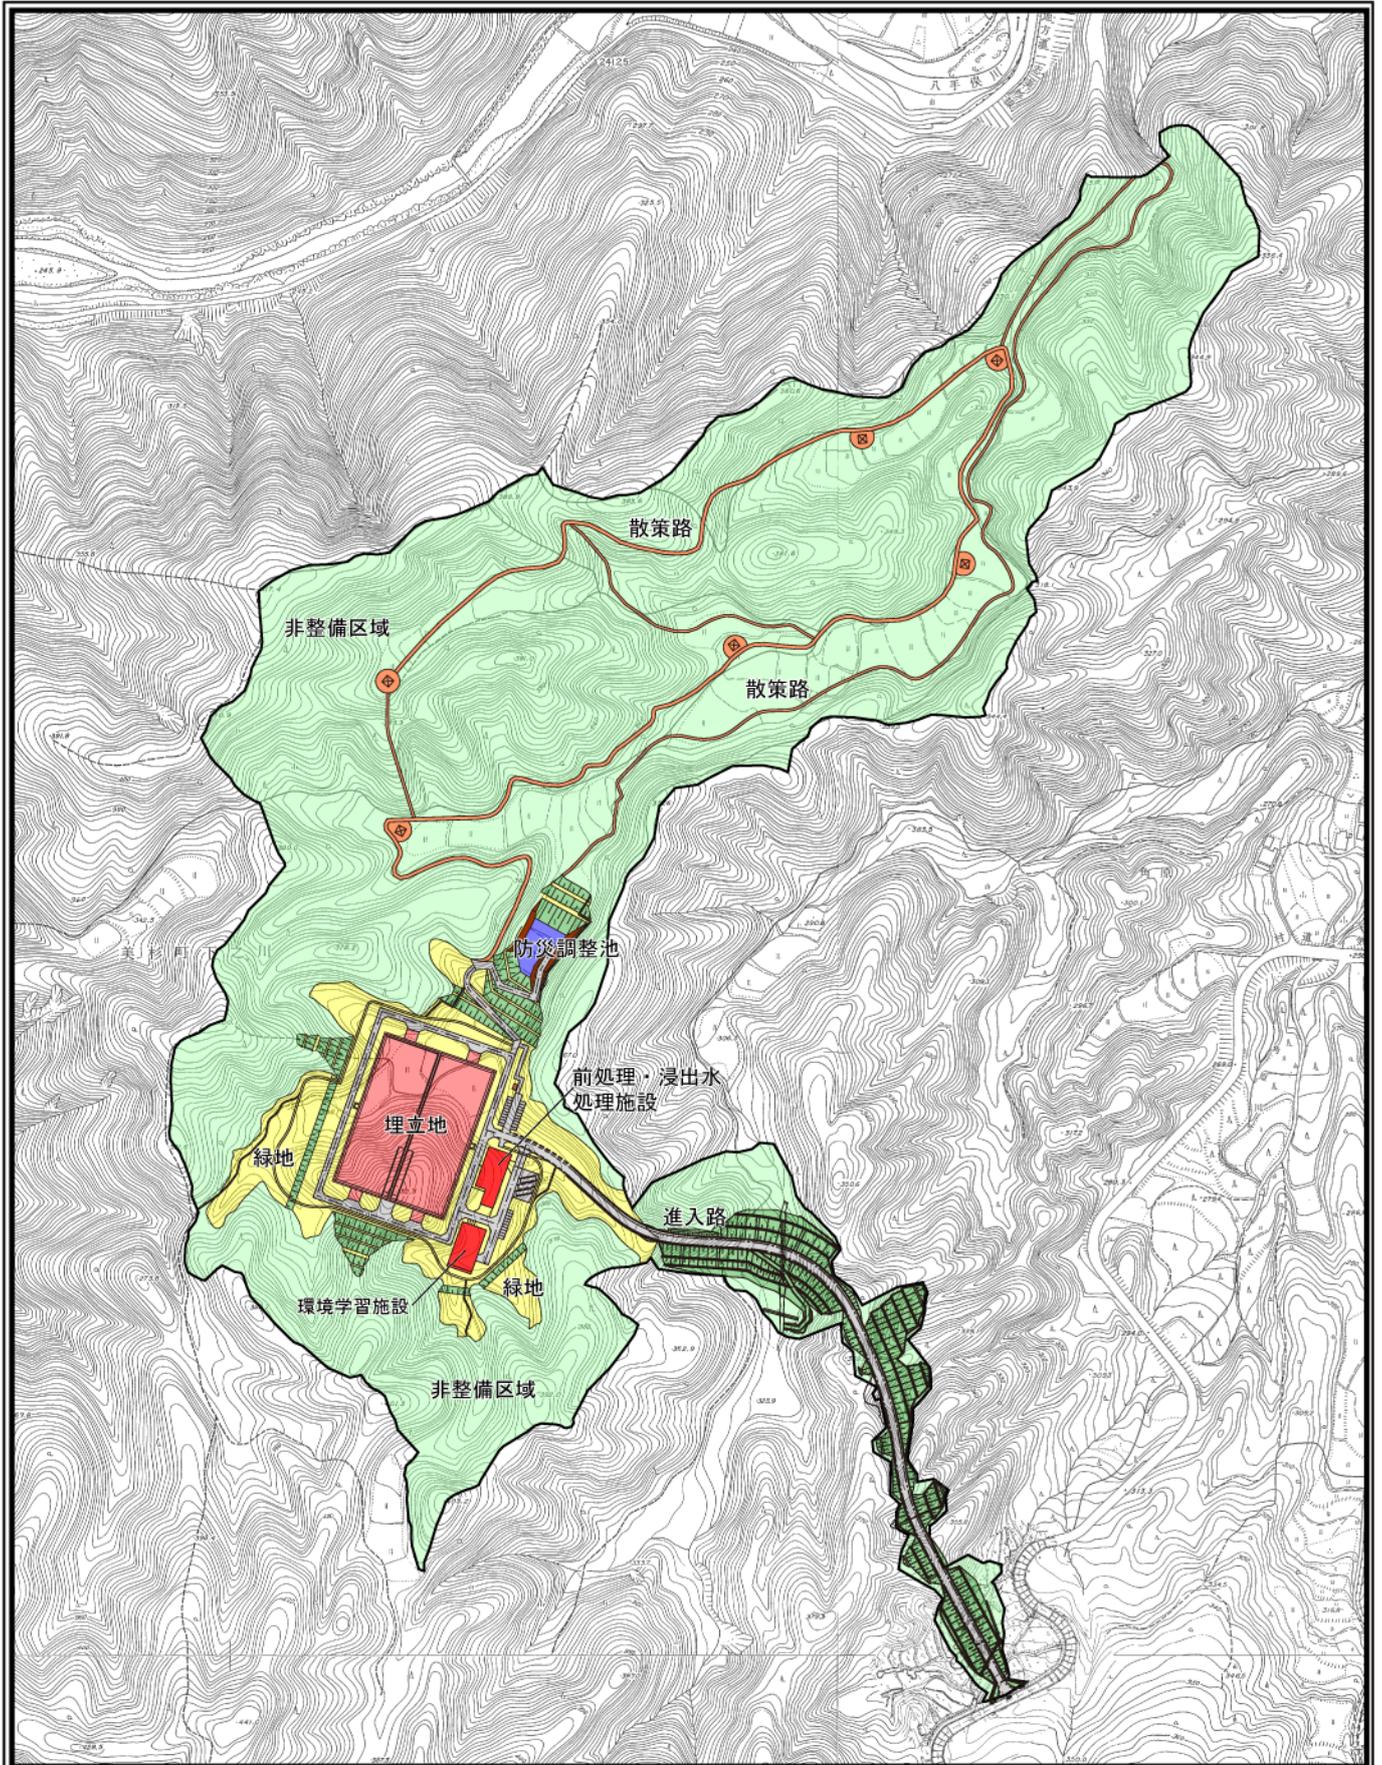

凡 例

——— : 対象事業実施区域

図 2-1 土地利用計画の概要

