令和４年度下工公補継第２号　藤方第２雨水幹線築造工事

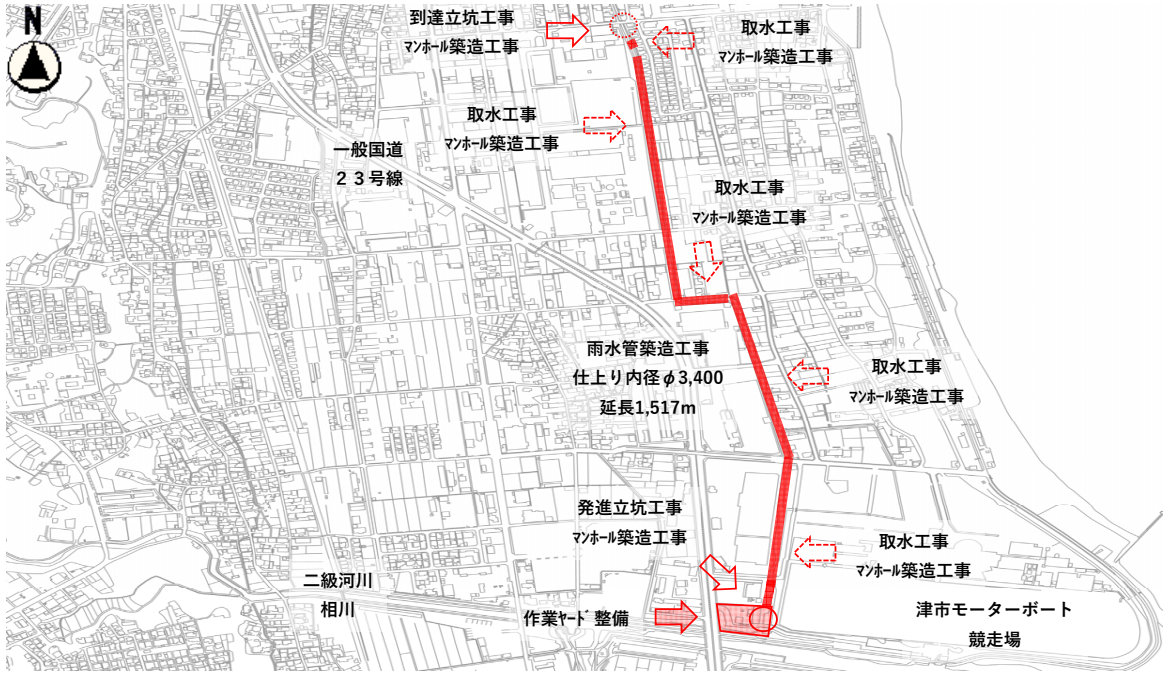

防音ハウス

シールド施工状況

		令和４年度								令和５年度												令和６年度												令和７年度												令和８年度											
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
準備・片付け工事 作業ﾔｰﾄﾞ整備 一式	計画																																																									
	実施																																																									
発進立坑工事 1箇所 ﾏﾝﾎｰﾙ築造工事 1箇所	計画																																																									
	実施																																																									
雨水管渠築造工事 仕上り内径φ3,400mm 延長1,517m	計画																																																									
	実施																																																									
到達立坑工事 1箇所 ﾏﾝﾎｰﾙ築造工事 1箇所	計画																																																									
	実施																																																									
取水工事 5箇所 ﾏﾝﾎｰﾙ築造工事 5箇所	計画																																																									
	実施																																																									
