令和４年度下工公補継第３号　半田川田第１雨水幹線築造工事（その２）

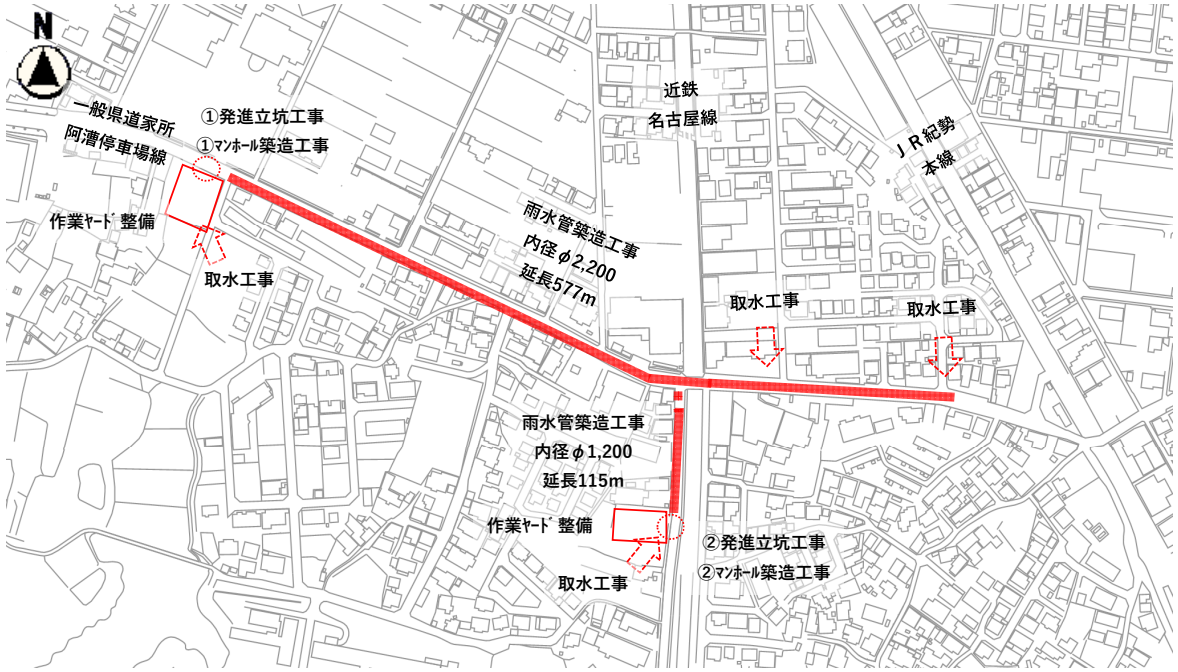

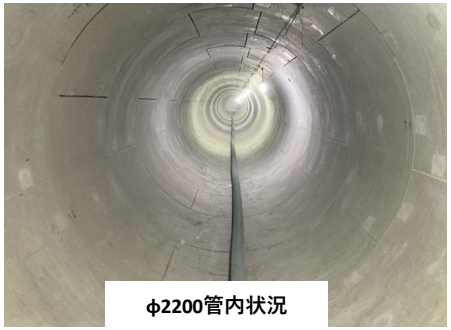
φ2200管内状況

取水工事

		令和４年度								令和５年度											
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
準備・片付け工事 作業ﾔｰﾄﾞ整備 一式 取水工事 2箇所	計画																				
	実施																				
① 発進立坑工事 1箇所 ① ﾏﾝﾎｰﾙ築造工事 1箇所	計画																				
	実施																				
雨水管渠築造工事 内径φ2,200mm 延長577m	計画																				
	実施																				
② 発進立坑工事 1箇所 ② ﾏﾝﾎｰﾙ築造工事 1箇所	計画																				
	実施																				
雨水管渠築造工事 内径φ1,200mm 延長115m	計画																				
	実施																				

		令和６年度												令和７年度												令和８年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
準備・片付け工事 作業ﾔｰﾄﾞ整備 一式 取水工事 2箇所	計画																																				
	実施																																				
① 発進立坑工事 1箇所 ① ﾏﾝﾎｰﾙ築造工事 1箇所	計画																																				
	実施																																				
雨水管渠築造工事 内径φ2,200mm 延長577m	計画																																				
	実施																																				
② 発進立坑工事 1箇所 ② ﾏﾝﾎｰﾙ築造工事 1箇所	計画																																				
	実施																																				
雨水管渠築造工事 内径φ1,200mm 延長115m	計画																																				
	実施																																				
